

GTR Bau GmbH

Untere Bliesstr. 13-15

66538 Neunkirchen/Saar

Pruefung Nummer/Name: Bettackerstrasse 14

Art der Pruefung : Abwasserleitung nach EN1610 mit Luft

PruefgeraetelNr : DP-177

Auftragsgeber :


Projekt :

Ort :

Strasse, Hausnr. :

Bauabschnitt :

Leitungsart :

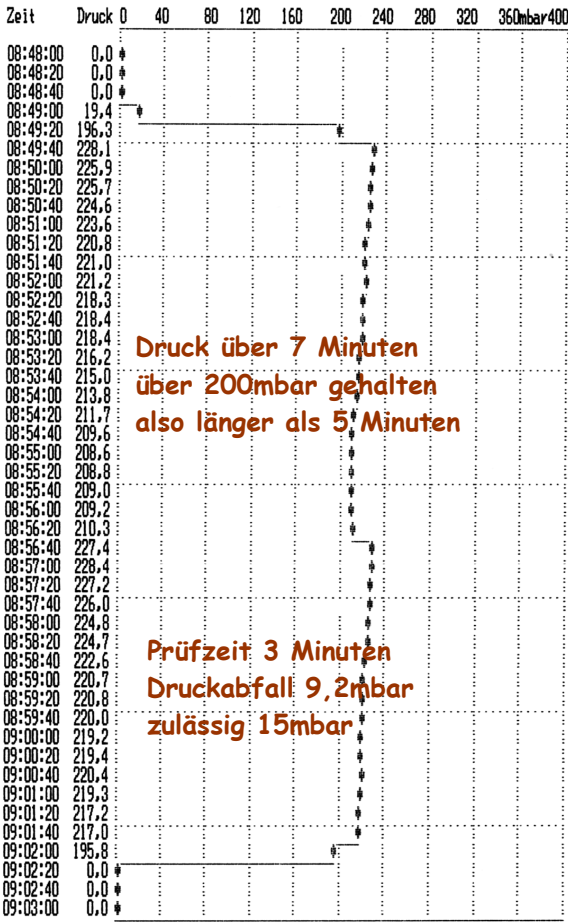

Druck über 7 Minuten über 200mbar gehalten also länger als 5 Minuten

Prüfzeit 3 Minuten Druckabfall 9,2mbar zulässig 15mbar

Ergebnis der Pruefung : Druck halten ok, Abfall ok

Anmerkungen :

Datum : 14.6.08 Pruefer : Pfaffenhuber

Ihr Spezialist fuer zeitnaehme Mess- und Registriersysteme

www.TECHNETICS.de Tel. 0761 - 45219 - 0

Firmenkopf, einmalige Eingabe über PC, auch weitere Informationen eingebbar, wie Info zum nächsten Kalibriertermin usw

Prüflingsbezeichnung: wird bei Start der Prüfung zur eindeutigen Identifizierung eingegeben

Projektdaten: diese Eintragungen erfolgen per Hand

Beleg des Prüfungsverlaufs:

exakt ablesbare Messzeitpunkte und Messwerte für Bewertung und Freigabe: Haltedauer, Haltedruck, Beginn und Ende der Druckabfallphase und Druckverlust grafischer Verlauf zur Orientierung

Die Freigabe erfolgt durch Markierung der Zeiten und Messwerte und Prüfergebnisangabe im Feld unten

oder durch Übertragung der Zeiten und Messwerte in Freigabeprotokollvorlage und

Ergebnisfeld, Freigabefeld, Anmerkungen

Datum, Unterschriftsfeld

Gebrauchsmusterschutz angemeldet
